


متابعة أعمال إنشاء مشروع رُبي مكة


يونيو 2021

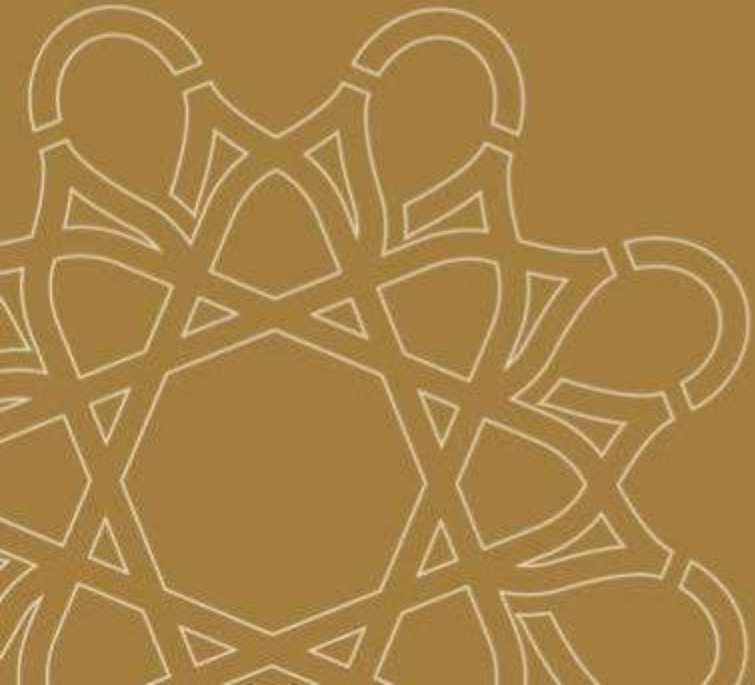


ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر:-

1. تم الانتهاء من أعمال الخرسانات للمشروع
2. أعمال المباني للدورين 14 و 15 ودروة السطح
3. أعمال اللياسة للدور العاشر والحادي عشر والثاني عشر المتكرر والواجهة الخلفية
4. أعمال عزل لأرضيات الحمامات للدورين السادس والسابع المتكرر
5. أعمال القواطيع الجبسية للدورين التاسع والعاشر المتكرر
6. أعمال تركيب الأسقف الجبسية بالغرف للأدوار 5 و 6 و 7
7. أعمال تركيب سيراميك حوائط الحمامات حتى الدور الخامس المتكرر
8. أعمال تركيب سيراميك أرضيات الغرف للدورين 3 و 5
9. أعمال تركيب جرانيت الدرج من الدور الأول إلى الدور السادس المتكرر
10. أعمال التأسيس للدهانات من الدور الخامس حتى الدور العاشر
11. التأسيس لأعمال الإليكتروميكانيك بالدور العاشر والحادي عشر والثاني عشر المتكرر

1- صورة جانبية للمبنى

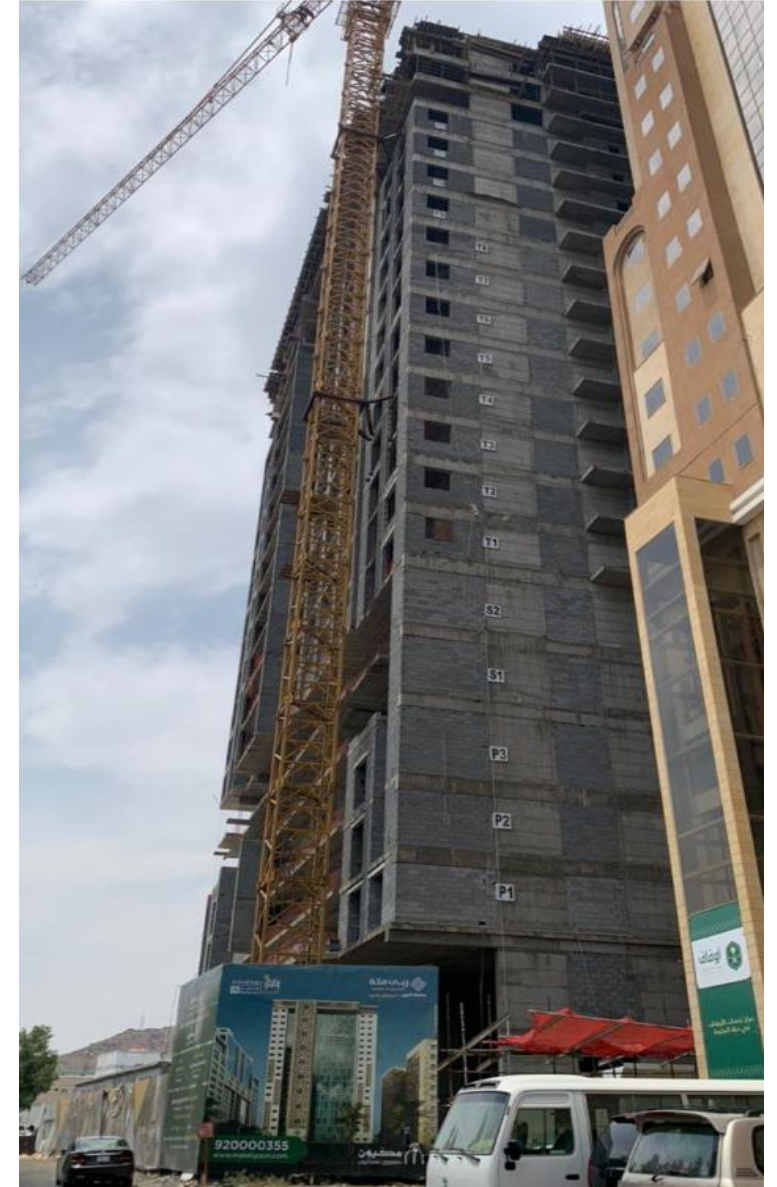

مايو 2021



يونيو 2021

2- أعمال المباني حتى الدور الخامس عشر المتكرر ودروة السطح



مباني الدور الخامس عشر المتكرر



مباني دروة السطح

3- أعمال لياسة الواجهة الخلفية للمبنى



4- أعمال عزل أرضيات الحمامات حتى الدور السابع المتكرر



5- أعمال تركيب الاسقف الجبسية وتأسيس الدهانات حتى الدور السابع المتكرر



6- أعمال تركيب سيراميك حوائط الحمامات حتى الدور الخامس المتكرر



7- أعمال تركيب الجرانيت لدرج السلالم حتى الدور السادس المتكرر



8- تأسيس أعمال الالكتروميكانيك حتى الدور الثانى عشر المتكرر





شكراً
